MACCIO TEC

PROPUESTA TÉCNICA & COMERCIAL · MAYO 2025

Sistema de Gestión Integral para King Pack

Plataforma web multi-sucursal a medida para reemplazar el sistema actual con arquitectura moderna, integración **ARCA/AFIP** nativa y acceso desde cualquier dispositivo.

17+	100%	ARCA	2
MÓDULOS	A MEDIDA	INTEGRADO	MESES

01 · CONTEXTO

El Problema Actual

King Pack opera con múltiples sucursales y un sistema a medida que presenta deficiencias críticas que afectan la operativa diaria y la toma de decisiones.

Problemas de Performance

Tiempos de respuesta lentos, cuellos de botella en operaciones concurrentes y cuelgues frecuentes que interrumpen la atención al cliente y la facturación.

Sin Arquitectura Escalable

La arquitectura legada impide agregar sucursales, usuarios o módulos sin riesgo de inestabilidad y costos de mantenimiento no planificados.

Integración AFIP/ARCA Deficiente

Fallas de sincronización, demoras en la emisión de CAE y ausencia de automatización para notas de crédito y otros comprobantes fiscales.

Visibilidad del Negocio Limitada

Sin panel de control centralizado, los datos de ventas, caja y stock no están disponibles en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales.

02 · ALCANCE FUNCIONAL

Módulos del Sistema

El sistema es una plataforma web **100% responsiva**, accesible desde computadoras, tablets y celulares sin necesidad de instalar nada. La **Etapa 1** cubre la operativa completa de la empresa.

DASHBOARD & CONTROL GENERAL

Dashboard Gerencial

Panel de control en tiempo real para el dueño. Desde una sola pantalla podés ver el estado actual del negocio: ventas del día, estado de cajas por sucursal, artículos con stock bajo, deudores con mayor saldo, comparativo mensual de ingresos vs. gastos, ranking de artículos más vendidos y alertas de operaciones pendientes.

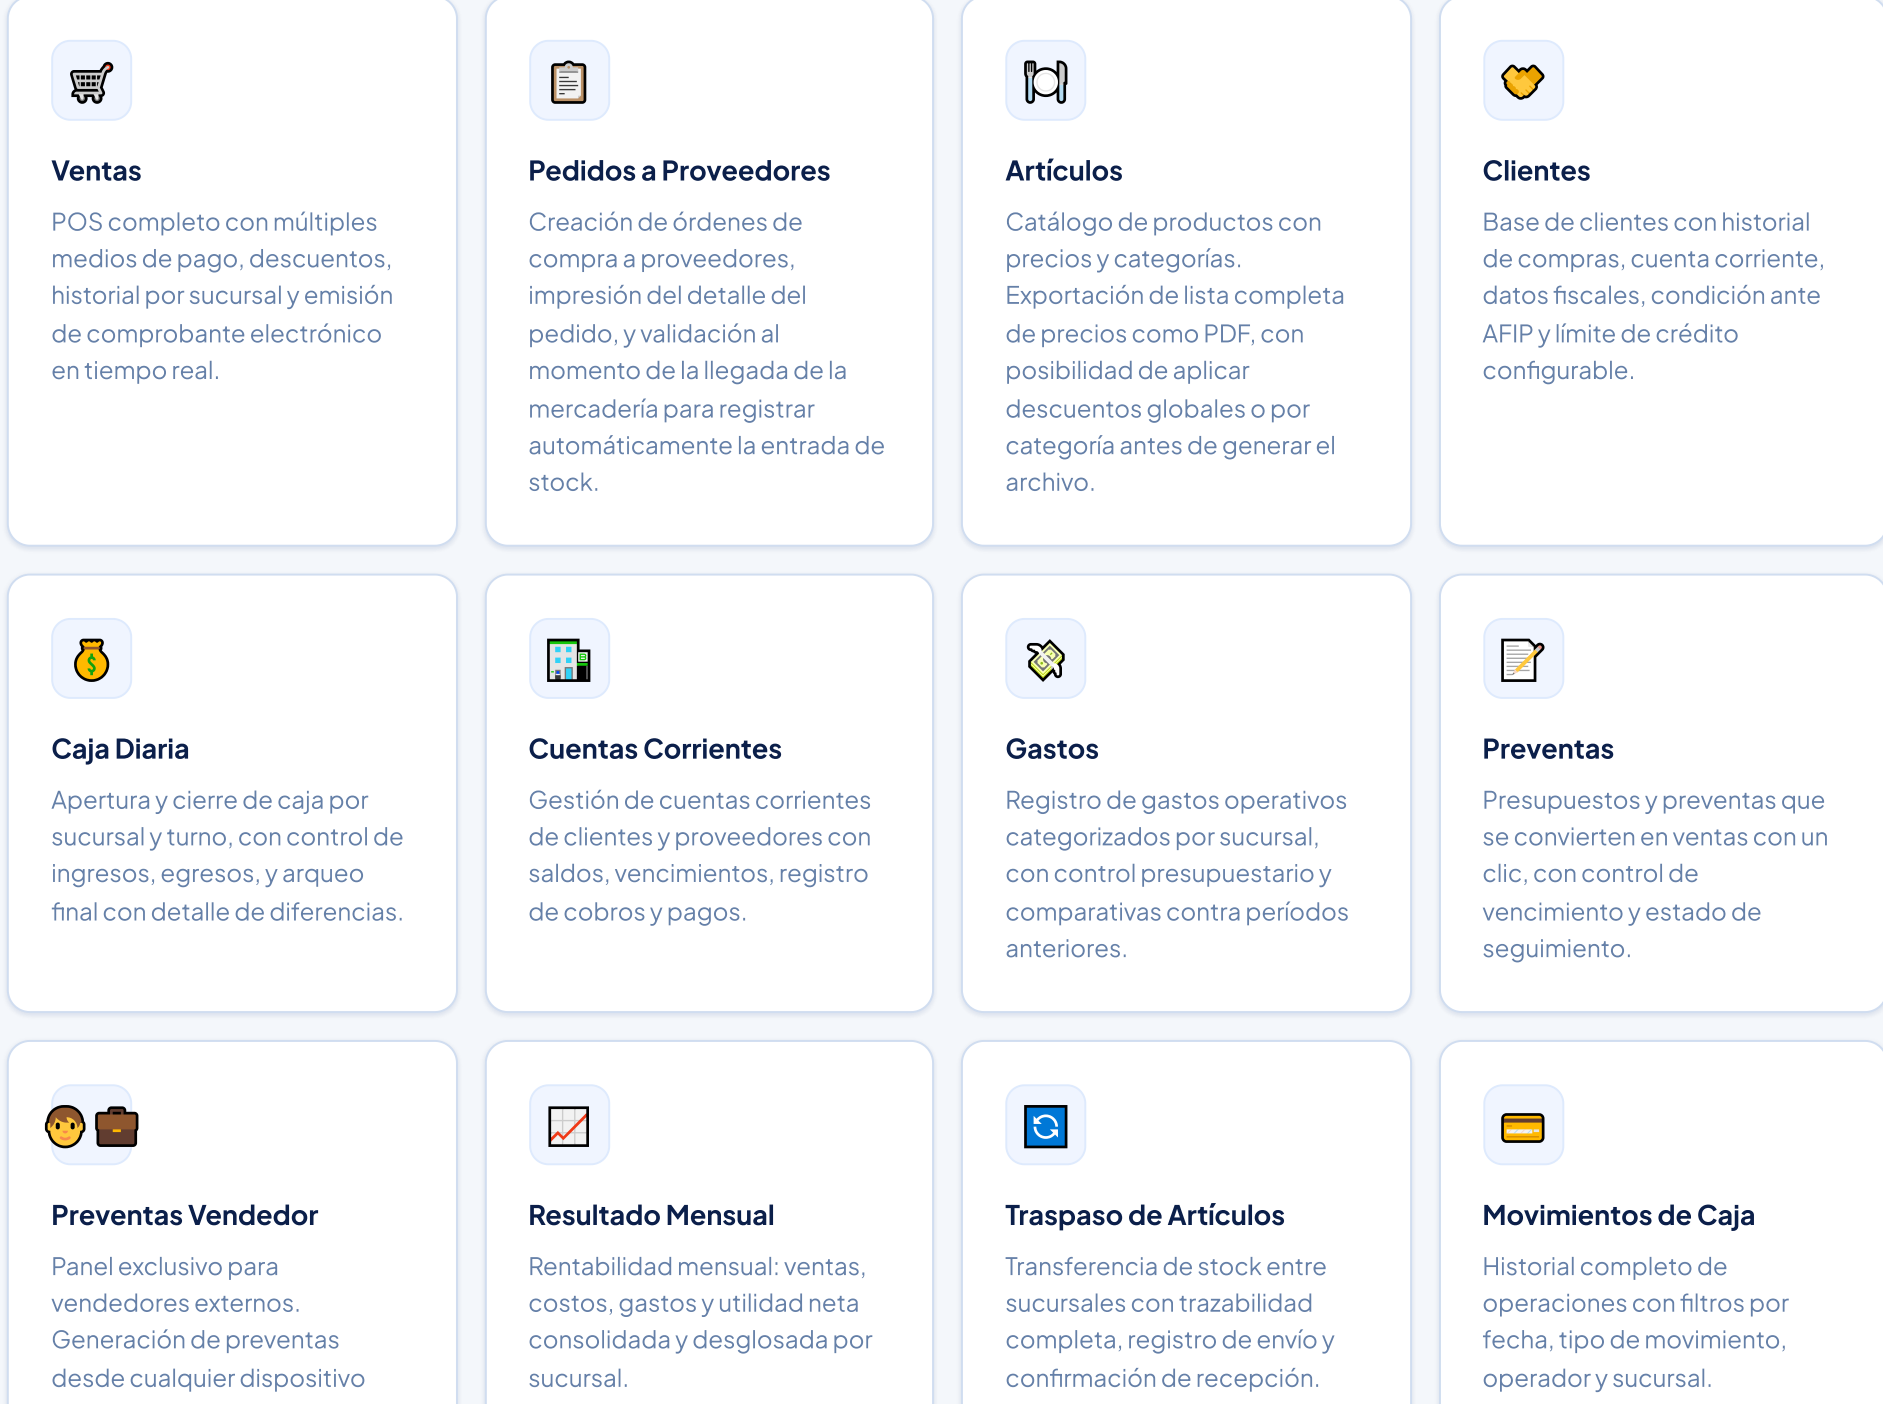

Vista previa referencial — Panel del dueño

VENTAS HOY
$284.500
↑ +12% vs ayer

CAJAS ABIERTAS
3 / 4
3 sucursales activas

GASTOS DEL MES
$98.200
↑ +5% vs mes ant.

CLIENTES CON DEUDA
14
3 vencidos

Ventas últimos 7 días — todas las sucursales

Alertas activas

BAJO	Vasos descartables 8oz — Suc. Centro
BAJO	Servilletas x 100 — Suc. Norte
DEUDA	Cliente: Restaurante El Sol — $42.000
PEDIDO	Pedido proveedor #087 — pendiente validar

MÓDULOS OPERATIVOS — ETAPA 1

Ventas

POS completo con múltiples medios de pago, descuentos, historial por sucursal y emisión de comprobante electrónico en tiempo real.

Pedidos a Proveedores

Creación de órdenes de compra a proveedores, impresión del detalle del pedido, y validación al momento de la llegada de la mercadería para registrar automáticamente la entrada de stock.

Artículos

Catálogo de productos con precios y categorías. Exportación de lista completa de precios como PDF, con posibilidad de aplicar descuentos globales o por categoría antes de generar el archivo.

Clientes

Base de clientes con historial de compras, cuenta corriente, datos fiscales, condición ante AFIP y límite de crédito configurable.

Caja Diaria

Apertura y cierre de caja por sucursal y turno, con control de ingresos, egresos, y arqueo final con detalle de diferencias.

Cuentas Corrientes

Gestión de cuentas corrientes de clientes y proveedores con saldos, vencimientos, registro de cobros y pagos.

Gastos

Registro de gastos operativos categorizados por sucursal, con control presupuestario y comparativas contra períodos anteriores.

Preventas

Presupuestos y preventas que se convierten en ventas con un clic, con control de vencimiento y estado de seguimiento.

Preventas Vendedor

Panel exclusivo para vendedores externos. Generación de preventas desde cualquier dispositivo con sincronización al sistema central.

Resultado Mensual

Rentabilidad mensual: ventas, costos, gastos y utilidad neta consolidada y desglosada por sucursal.

Traspaso de Artículos

Transferencia de stock entre sucursales con trazabilidad completa, registro de envío y confirmación de recepción.

Movimientos de Caja

Historial completo de operaciones con filtros por fecha, tipo de movimiento, operador y sucursal.

Proveedores

Gestión del padrón de proveedores con datos fiscales, historial de compras, saldo de deuda y condiciones de pago pactadas.

Usuarios & Roles

Control de acceso por rol (Administrador, Supervisor, Cajero, Vendedor) con log de auditoría completo y permisos configurables.

Categorías

Árbol de categorías y subcategorías de productos con márgenes de ganancia diferenciados por grupo.

Ventas por Vendedor

Seguimiento individual de ventas por vendedor con comisiones calculadas automáticamente, objetivos y ranking de performance.

Multi-Sucursal

Panel central para gestionar todas las sucursales: stock, cajas, usuarios y reportes unificados desde un único acceso.

Empleados

Legajo digital por sucursal: datos personales, cargo, fecha de ingreso y documentación adjunta digitalizada.

Integración ARCA / AFIP — Facturación Electrónica Completa

El sistema incluye integración nativa con los Web Services de **ARCA (ex-AFIP)**: emisión de **Facturas A y B, Tickets, Notas de Crédito y Notas de Débito**. Soporte para responsables inscriptos, monotributistas y exentos. Generación automática de PDF con CAE y código QR oficial. Consulta de CUIT, condición tributaria y padrones fiscales en tiempo real. Múltiples puntos de venta por sucursal.

Etapa 2 — Inteligencia Artificial & Analytics (Opcional) COSTO A DEFINIR

Expansión opcional fuera del alcance de la presente propuesta. Incluye: análisis predictivo de ventas con IA, detección de anomalías en la operativa, recomendaciones automatizadas de restock, dashboard ejecutivo avanzado con KPIs configurables, alertas inteligentes y exportación avanzada de informes. El costo y alcance de esta etapa se cotizará por separado una vez finalizada e implementada la Etapa 1.

- Predicción de Ventas IA
- Restock Inteligente
- Dashboard Ejecutivo Avanzado
- Alertas Automáticas
- Informes Personalizados
- Exportación Excel / PDF

03 · ARQUITECTURA TÉCNICA

Stack Tecnológico

Tecnologías maduras y probadas en producción, seleccionadas para resolver los problemas de rendimiento del sistema actual y garantizar acceso desde cualquier dispositivo.

Next.js 14	Frontend web responsivo (desktop, tablet, móvil)
Node.js + Express	API REST Backend
PostgreSQL 16	Base de datos relacional
Redis	Caché & gestión de sesiones
Puppeteer / PDFKit	Generación de documentos PDF
VPS Dedicado	Servidor & base de datos en la nube

¿Por qué esta arquitectura resuelve los problemas actuales?

PostgreSQL garantiza transacciones concurrentes con integridad ACID, eliminando la corrupción de datos. **Redis** actúa como caché inteligente, reduciendo la carga a la base de datos hasta en un 70%. **Next.js responsivo** asegura tiempos de carga menores a 300ms desde cualquier dispositivo sin instalar aplicaciones. La arquitectura en capas (Frontend / API / DB) permite escalar cada componente de forma independiente.

04 · MODELO DE DATOS

Base de Datos Relacional

Esquema normalizado con integridad referencial completa, diseñado para rendimiento en consultas complejas y facilidad de evolución futura.

sucursales	
id	PK
nombre	varchar
direccion	text
telefono	varchar
cuit_sucursal	varchar
punto_venta_afip	int
activo	bool

usuarios	
id	PK
nombre	varchar
email	varchar
password_hash	varchar
rol	enum
sucursal_id	FK
activo	bool

clientes	
id	PK
razon_social	varchar
cuit	varchar
cond_iva	enum
email	varchar
limite_credito	decimal
saldo_cc	decimal

proveedores	
id	PK
razon_social	varchar
cuit	varchar
email	varchar
telefono	varchar
cond_pago	varchar
saldo_deuda	decimal

pedidos_compra	
id	PK
proveedor_id	FK
sucursal_id	FK
usuario_id	FK
estado	enum
fecha_pedido	date
fecha_recepcion	timestamp

articulos	
id	PK
codigo	varchar
descripcion	text
categoria_id	FK
precio_costo	decimal
precio_venta	decimal
iva_alicuota	decimal

stock	
id	PK
articulo_id	FK
sucursal_id	FK
cantidad	decimal
stock_minimo	decimal
ultima_actualizacion	timestamp

ventas	
id	PK
numero	varchar
cliente_id	FK
sucursal_id	FK
total	decimal
cae	varchar
tipo_comprobante	enum

venta_items	
id	PK
venta_id	FK
articulo_id	FK
cantidad	decimal
precio_unit	decimal
descuento	decimal
iva_monto	decimal

cajas	
id	PK
sucursal_id	FK
usuario_id	FK
saldo_inicial	decimal
saldo_final_real	decimal
diferencia	decimal
apertura	timestamp

movimientos_caja	
id	PK
caja_id	FK
tipo	enum
concepto	text
monto	decimal
medio_pago	enum
fecha	timestamp

gastos	
id	PK
sucursal_id	FK
categoria_gasto_id	FK
descripcion	text
monto	decimal
fecha	date
comprobante_url	varchar

traspasos	
id	PK
sucursal_origen_id	FK
sucursal_destino_id	FK
usuario_id	FK
estado	enum
fecha_envio	timestamp
fecha_recepcion	timestamp

empleados	
id	PK
nombre	varchar
dni	varchar
sucursal_id	FK
cargo	varchar
fecha_ingreso	date
salario	decimal

preventas	
id	PK
cliente_id	FK
vendedor_id	FK
sucursal_id	FK
total	decimal
estado	enum
venta_id	FK null

categorias	
id	PK
nombre	varchar
parent_id	FK null
margen_ganancia	decimal
activo	bool

05 · PLAN DE TRABAJO

Cronograma en 2 Meses

Un mes de construcción y un mes de implementación acompañada. Al finalizar el segundo mes, el equipo de King Pack estará operando con plena autonomía en el nuevo sistema.

MES 1 · 4 semanas · Construcción del sistema

Desarrollo Completo

Desarrollo full-stack de todos los módulos de la Etapa 1, integración con ARCA/AFIP, generación de PDFs, configuración del servidor, base de datos y entorno de producción. Entregas parciales cada semana para revisión del cliente.

- Dashboard Gerencial
- Ventas & Facturación ARCA
- Pedidos a Proveedores
- Artículos & Stock
- Caja & Movimientos
- Clientes & Cuentas
- Gastos
- Preventas
- Traspaso Artículos
- Notas de Crédito
- Usuarios & Roles
- Multi-sucursal
- Generación PDF

MES 2 · 4 semanas · Implementación y puesta en marcha

Implementación Acompañada

Puesta en producción del sistema, migración de datos históricos (artículos, clientes, proveedores), capacitación presencial y/o remota del equipo, y acompañamiento diario durante la transición. MACCIO TEC disponible para soporte inmediato durante todo el proceso.

- Deploy en servidor
- Migración de datos
- Capacitación equipo
- Inducción por roles
- Soporte en tiempo real
- Ajustes finales
- Alta en ARCA

MES 3+ · Mantenimiento mensual continuo

Soporte y Mantenimiento

A partir del tercer mes, el sistema opera bajo el plan de mantenimiento mensual fijo. Incluye soporte técnico, actualizaciones de seguridad, actualización de endpoints ARCA, backups diarios y una mejora menor mensual incluida.

- Actualizaciones ARCA
- Seguridad
- Backups diarios
- Monitoreo 24/7

06 · INVERSIÓN

Estructura de Pago

Inversión total clara y sin costos ocultos. El plan de mantenimiento mensual incluye la infraestructura del servidor, por lo que no existen gastos adicionales de hosting a cargo del cliente.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

USD 1.500

Sistema completo · 2 meses · Etapa 1

MANTENIMIENTO MENSUAL

USD 250

A partir del mes 3 · Infraestructura incluida

Plan de pagos

PAGO 1 — INICIO DE OBRA

USD 750

Al firmar la propuesta y comenzar el desarrollo

PAGO 2 — FIN DE IMPLEMENTACIÓN

USD 750

Al completar el mes 2 de implementación acompañada

MES 3 EN ADELANTE

USD 250

Mantenimiento mensual fijo · Infraestructura incluida

Desglose del sistema (Etapa 1)

Sobre la moneda: Los valores se expresan en **Dólares Estadounidenses (USD)** para proteger la inversión de ambas partes ante la variación cambiaria. La facturación puede realizarse en pesos argentinos al tipo de cambio oficial o dólar MEP vigente al día de cada pago.

COMPONENTE / MÓDULO	HORAS	INCLUIDO EN
Configuración servidor, base de datos y entornos de desarrollo/producción	15 hs	Pago 1
Autenticación, roles, permisos y gestión multi-sucursal	30 hs	Pago 1
Dashboard Gerencial (KPIs, alertas, gráficos en tiempo real)	25 hs	Pago 1
Módulo Ventas — POS completo con medios de pago múltiples	40 hs	Pago 1
Módulo Artículos, Categorías, Stock y exportación PDF con descuentos	30 hs	Pago 1
Módulo Pedidos a Proveedores — creación, impresión y validación de llegada	30 hs	Pago 1
Módulo Proveedores — padrón, historial de compras, cuentas a pagar	15 hs	Pago 1
Módulo Clientes y Cuentas Corrientes	20 hs	Pago 1
Módulo Caja Diaria y Movimientos de Caja	25 hs	Pago 1
Módulo Gastos operativos	15 hs	Pago 1
Módulo Preventas y Preventas Vendedor	25 hs	Pago 1
Módulo Traspaso de Artículos entre sucursales	15 hs	Pago 1
Módulo Resultado Mensual, Empleados, Ventas por Vendedor	25 hs	Pago 1
Integración ARCA/AFIP — Facturas, Notas de Crédito, Padrones	40 hs	Pago 1
Generación de PDF (facturas, remitos, pedidos, lista de precios)	15 hs	Pago 1
Testing, QA y documentación técnica	20 hs	Pago 1
Deploy en producción, migración de datos del sistema anterior	10 hs	Pago 2
Implementación acompañada, capacitación y soporte de transición	20 hs	Pago 2
TOTAL ETAPA 1 — Sistema completo + implementación	**~415 hs**	**USD 1.500**

Etapa 2 — IA & Analytics: Esta etapa es completamente opcional y queda fuera del alcance y costo de la presente propuesta. Su costo y alcance serán cotizados por separado una vez finalizada e implementada la Etapa 1.

07 · GARANTÍAS

Nuestro Compromiso

El sistema desarrollado es propiedad intelectual de King Pack. El código fuente completo es entregado al cliente al finalizar la implementación.

Código Fuente Propio

Código 100% propiedad de King Pack. Repositorio en GitHub del cliente. Sin vendor lock-in de ningún tipo.

Garantía Post-Entrega

60 días de garantía por bugs sin costo adicional. Resolución comprometida en 48 horas hábiles.

Documentación Completa

Manual de usuario por rol, documentación técnica de la API y diagrama entidad-relación de la base de datos.

Capacitación Incluida

Sesiones de capacitación para administradores y operadores con material audiovisual de referencia permanente.

Migración de Datos

Migración completa de clientes, artículos, proveedores e historial del sistema actual al nuevo sin pérdida de información.

Acceso Responsivo

El sistema funciona en cualquier dispositivo con navegador: computadoras, tablets y celulares. Sin instalaciones.

08 · CONTACTO

¿Listo para empezar?

Estamos disponibles para responder cualquier consulta, ampliar detalles técnicos o coordinar la firma de inicio del proyecto.

MACCIO TEC

Desarrollo de software a medida para empresas que necesitan crecer sin límites. Soluciones confiables, escalables y diseñadas para durar.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Franco Maccio — Dueño

WHATSAPP & TELÉFONO
+549 387 462-4579

REPOSITORIO DEL PROYECTO
github.com/francomaccio15/KINGPACK

UBICACIÓN
Salta, Argentina

MACCIO TEC

Desarrollo de software a medida para empresas que necesitan crecer sin límites. Soluciones confiables, escalables y diseñadas para durar.

PROYECTO

Sistema Integral **King Pack**
Versión **1.0 — Mayo 2025**
Duración: **2 meses**
Stack: **Next.js + PostgreSQL**
Repo: **francomaccio15/KINGPACK**

CONTACTO

Franco Maccio
Dueño — MACCIO TEC
+549 387 462-4579
Salta, Argentina

© 2025 MACCIO TEC · Todos los derechos reservados

DOCUMENTO CONFIDENCIAL · USO EXCLUSIVO KING PACK S.R.L.
